

Plano: Player Web = Player-AD (versão browser) + Visual TotemDigital

Data: 2026-07-21

Branch: SmartSignage-direc-totem

Estado: planeamento — sem implementação neste documento

Repositório: TotemDigital / SmartSignage Pro

1. Objetivo

Retomar o player-web (hoje desatualizado face ao Player-AD) e evoluí-lo até ser a **versão web equivalente ao Player-AD**, já preparada para integrar o **visual novo** (Amarelo Petróleo / biblioteca visual TotemDigital.BV).

O player web deve:


- Usar o **mesmo contrato** de API do Player-AD (/api/player/*).
 - Reproduzir o **mesmo DispatchPlan**.
 - Executar **comandos remotos** relevantes no browser.
 - Apresentar identidade **TotemDigital / Amarelo Petróleo**.
 - Correr em Chromium kiosk, Electron ou URL directa — **sem** o Express standalone do BV.
-

2. Estado atual

Peça	Situação
player-web/	Player V3x oficial (JS vanilla), servido em /player
Fluxo	token → heartbeat → DispatchPlan → cache IndexedDB → playback
Versão típica	2.2.0 (browser-cache)
Lacunas vs AD	Comandos remotos só enfileiram (não executam); sem config remota completa; sem screenshot; sem OTA; sem rotação de conteúdo 9:16; visual genérico
Visual.Interface/TotemDigital.BV	Mini CMS + player isolado (JSON local) — protótipo visual, não player de produção
electron-player/	Shell que só abre URL — reutilizável depois
Player-AD (Android)	Referência de paridade (ExoPlayer, remote commands, config, OTA)

Conclusão: não recomeçar do zero. Evoluir player-web e usar BV apenas como **skin / estados de ecrã** (e, opcionalmente, fonte de boards HTML no futuro).

3. Arquitetura alvo

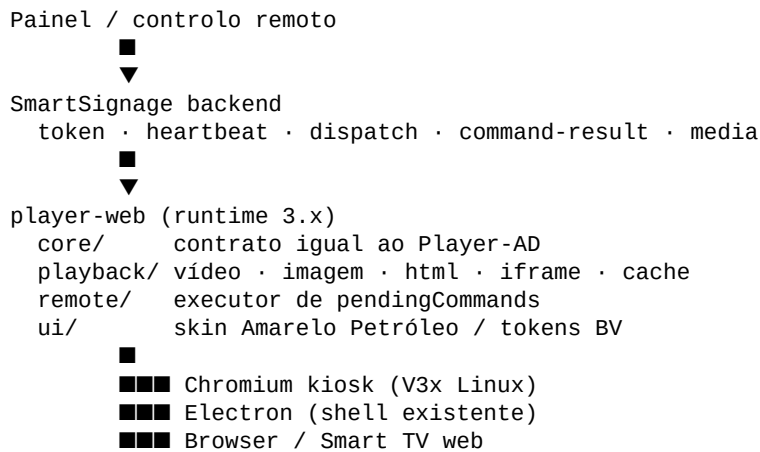

Regra: o Express do TotemDigital.BV **não** substitui o player de campo.

4. Matriz de paridade Player-AD → Web

Capacidade	Player-AD	player-web hoje	Meta
Ativação UIN / register	Sim	Sim	Manter + UI nova
Token + heartbeat + dispatch	Sim	Sim	Manter
Cache de mídia	FS / USB	IndexedDB	Manter e endurecer
Playback vídeo / imagem / html	Sim	Parcial	Paridade de tipos do plano
pendingCommands + command-result	Sim	Não executa	Prioridade P0
apply_player_config / rotação	Sim	Não	CSS + config
Screenshot remoto	Sim	Não	Captação limitada no browser
OTA APK	Sim	N/A	Reload / version bump web
Áudio / mute	Configurável	Mute fixo	Config como AD
Debug / conectividade / playlist	Ecrã nativo	Painel fraco	Ecrã tipo config AD (web)
Visual marca	—	Genérico	Skin Amarelo Petróleo

5. Fases e estimativas

Fase 0 — Base e contrato (2–3 dias)

- Inventário de player-web/js vs endpoints do Player-AD.
- Spec de módulos: core/, playback/, remote/, ui/.
- Decisão: evoluir in-place (recomendado) com version bump **3.0.0**.

- Critério de saída: zero regressão no fluxo token → dispatch → play.

Fase 1 — Motor = contrato AD (4–6 dias)

- Executor de comandos: `invalidate_*`, `refresh_dispatch`, `purge_cache`, `reload`, `apply_player_config` (subconjunto web).
- `POST /api/player/command-result`.
- Alinhar `now_playing` / métricas no heartbeat.
- Critério: controlo remoto do painel age no Chromium kiosk.

Fase 2 — Visual BV / Amarelo Petróleo (2–4 dias)

- Tokens CSS a partir da apresentação / BV (`theme-petroleo.css`).
- Ecrãs: loading, online/offline, sem mídia, aguardando aprovação, erro de rede.
- Não embutir CRUD Express do BV no player.
- Critério: identidade TotemDigital no primeiro viewport.

Fase 3 — Orientação e playback (3–5 dias)

- `displayRotation` 0–3 via CSS (espelho AD).
- `FIT/contain` alinhado à biblioteca (`bake v3/v4`).
- Áudio configurável; watchdog reforçado.
- Critério: mesmo plano no AD e no web com layout coerente em 9:16.

Fase 4 — Conteúdo do visual novo (opcional, 3–7 dias)

- Boards BV → mídia `html / iframe` no SmartSignage → `DispatchPlan`.
- Player web só consome o plano (Opção A do handoff BV).
- Critério: conteúdo dinâmico BV no totem web sem segundo backend.

Fase 5 — Empacote e operações (2–3 dias)

- Atualizar `install-player-v3x-linux-kiosk.sh` e documentação.
- Electron carrega a mesma URL.
- Checklist de teste paralelo AD ↔ Web no mesmo UIN.

Total Fases 0–3: cerca de 2–3 semanas

Com Fases 4–5: cerca de 3–4 semanas

6. O que não fazer

- Não fundir o Express do BV com o player de produção.
- Não transformar o player de totem numa app React do admin (manter fullscreen leve).
- Não abandonar `player-web` a favor só do `TotemDigital.BV`.
- Não prometer OTA APK / reboot de hardware no browser.

- Não alterar código até autorização explícita da Fase 0 (ou do pacote escolhido).

7. Decisões pendentes

- ■ Escopo da 1ª entrega: só comandos + visual, ou também rotação?
- ■ Nome: manter player-web 3.0 ou criar player-web-ad?
- ■ BV nesta vaga: só skin (Fase 2) ou também boards no DispatchPlan (Fase 4)?
- ■ Hardware prioritário: Chromium kiosk Linux primeiro, ou também browser em Smart TV?

8. Recomendação

Começar por **Fases 0 + 1 + 2**:

- Contrato AD operacional (comandos remotos).
- Skin Amarelo Petróleo.
- Em cima do player-web existente.

Depois: orientação (Fase 3) e boards BV (Fase 4).

Autorização sugerida: «autorizo Fase 0 e 1» ou «0–2 com só skin BV».

9. Referências no repositório

Tema	Caminho
Player web atual	player-web/
Player Android	Player-AD/
Visual / BV	Visual.Interface/TotemDigital.BV/
Handoff continuidade	docs/HANDOFF-CONTINUIDADE-PRODUTO-2026-07-21.md
Player oficial V3x	docs/PLAYER_OFICIAL_V3X.md
Fluxo web + dispatcher	docs/FLUXO_COMPLETO_PLAYER_WEB_CACHE_UIN_DISPATCHER_APROVACAO.md
Controlo remoto	docs/PLANO-TOTEM-ORIENTACAO-CONFIG-REMOTA-SCREENSHOT.md
Kiosk Linux	scripts/install-player-v3x-linux-kiosk.sh

10. Prompt para continuar com outra IA

Contexto: TotemDigital, branch SmartSignage-direc-totem.
Lê: docs/PLANO-PLAYER-WEB-AD-VISUAL-2026-07-21.md (e este PDF).
Também: docs/HANDOFF-CONTINUIDADE-PRODUTO-2026-07-21.md
Tarefa: implementar apenas as fases autorizadas do player-web = Player-AD web.

Não misturar Express do TotemDigital.BV no runtime do player.
Português; não alterar código sem autorização da fase.

Documento de planeamento. Não substitui o schema SQL nem o código do Player-AD; define o caminho de evolução do player-web.
